

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	04 Octobre 2010							11 Octobre 2010							18 Octobre 2010							25 Octobre 2010							01 Novembre 2010													
				40							41							42							43							44													
				D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D						
1	Maçonnerie	40 jours	Lun 04/10/10																																										
2	Terrassement + Dalle	20 jours	Lun 04/10/10																																										
3	Mur de refend RDC + étage	5 jours	Lun 22/11/10																																										
4	Surfaçage dalle	89 jours	Lun 15/11/10																																										
5	Premier passage	3 jours	Lun 15/11/10																																										
6	Deuxième passage	3 jours	Mar 15/03/11																																										
7	Charpente	114 jours	Lun 08/11/10																																										
8	Levage	5 jours	Lun 08/11/10																																										
9	Bardage	15 jours	Lun 15/11/10																																										
10	Isolation	5 jours	Lun 06/12/10																																										
11	Doublage + distribution	79 jours	Lun 13/12/10																																										
12	Couverture	10 jours	Lun 13/12/10																																										
13	Couverture	10 jours	Lun 13/12/10																																										
14	Electricité	104 jours	Mer 13/10/10																																										
15	Passage gaines	5 jours	Mer 13/10/10																																										
16	Installation générale	15 jours	Mar 15/02/11																																										
17	Plomberie	99 jours	Mer 20/10/10																																										
18	Incorporation	5 jours	Mer 20/10/10																																										
19	Capteurs solaires	2 jours	Lun 13/12/10																																										
20	Installation générale	15 jours	Mar 15/02/11																																										
21	Plâtrerie	5 jours	Lun 29/11/10																																										
22	Plâtrerie mur de refend	5 jours	Lun 29/11/10																																										
23	Tulikivi	10 jours	Lun 13/12/10																																										
24	Fourniture solin +tuyau	1 jour	Lun 13/12/10																																										
25	Pose du poêle	5 jours	Lun 20/12/10																																										

Projet : planning chantier
Date : Mer 29/09/10

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement




Récapitulatif du projet




Échéance



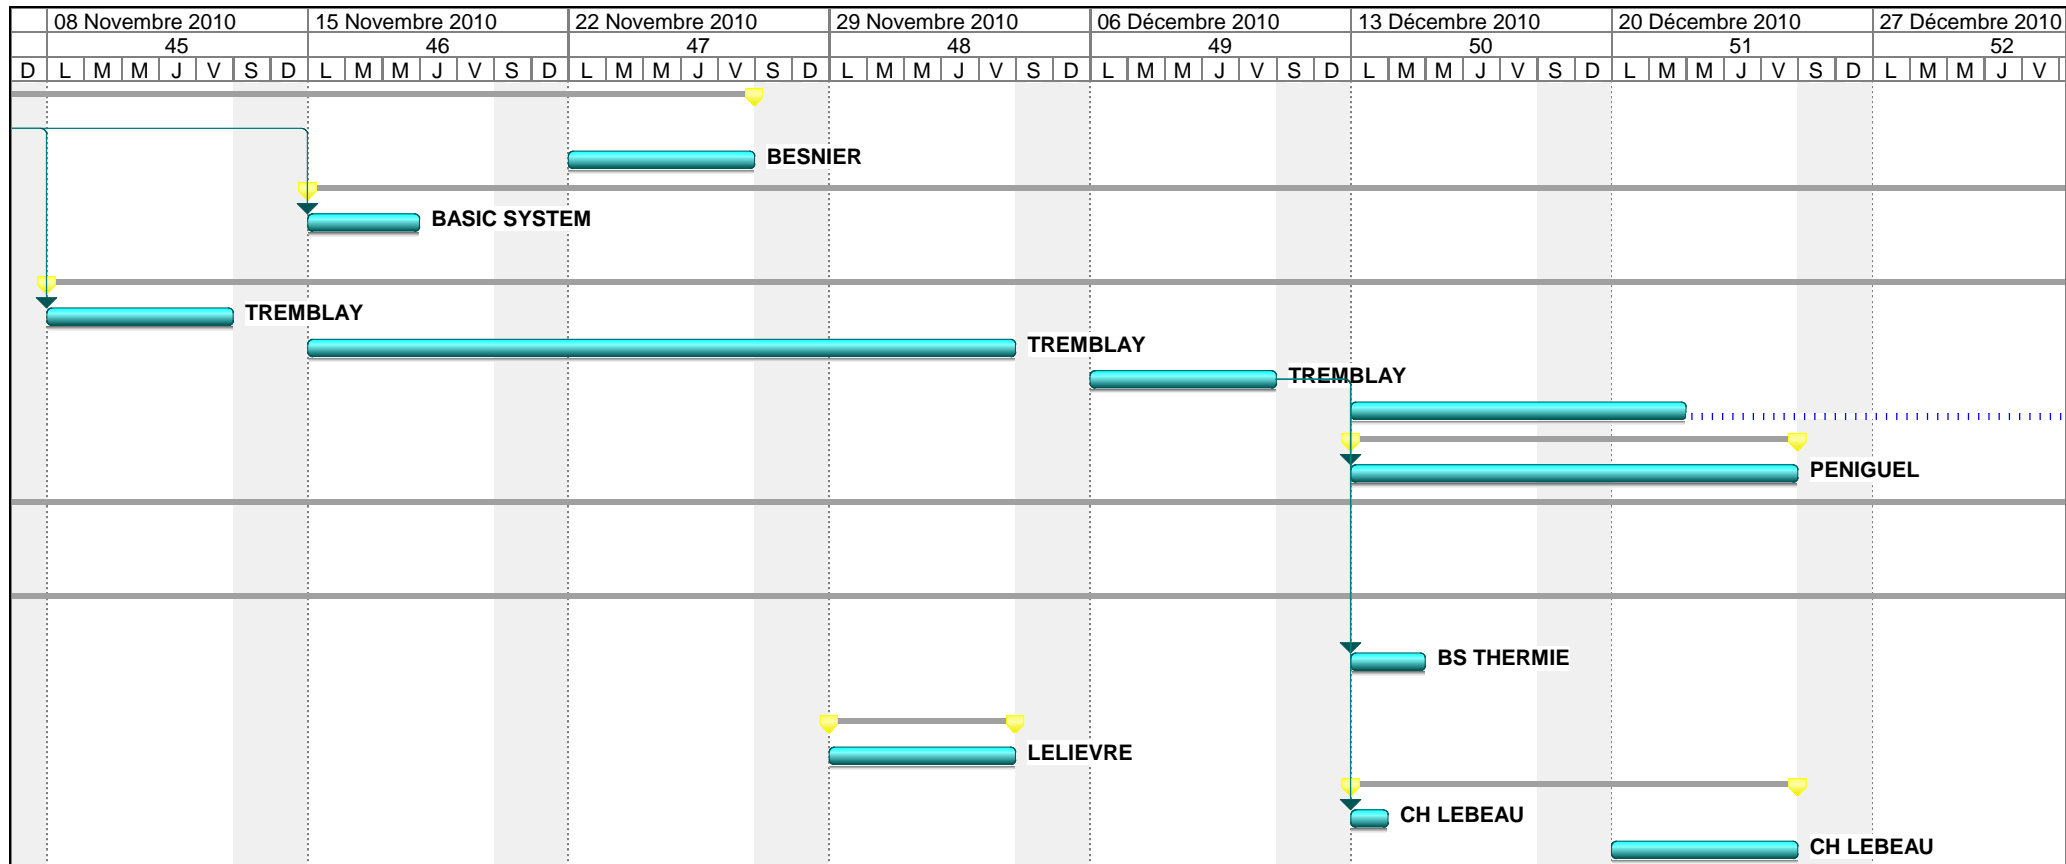





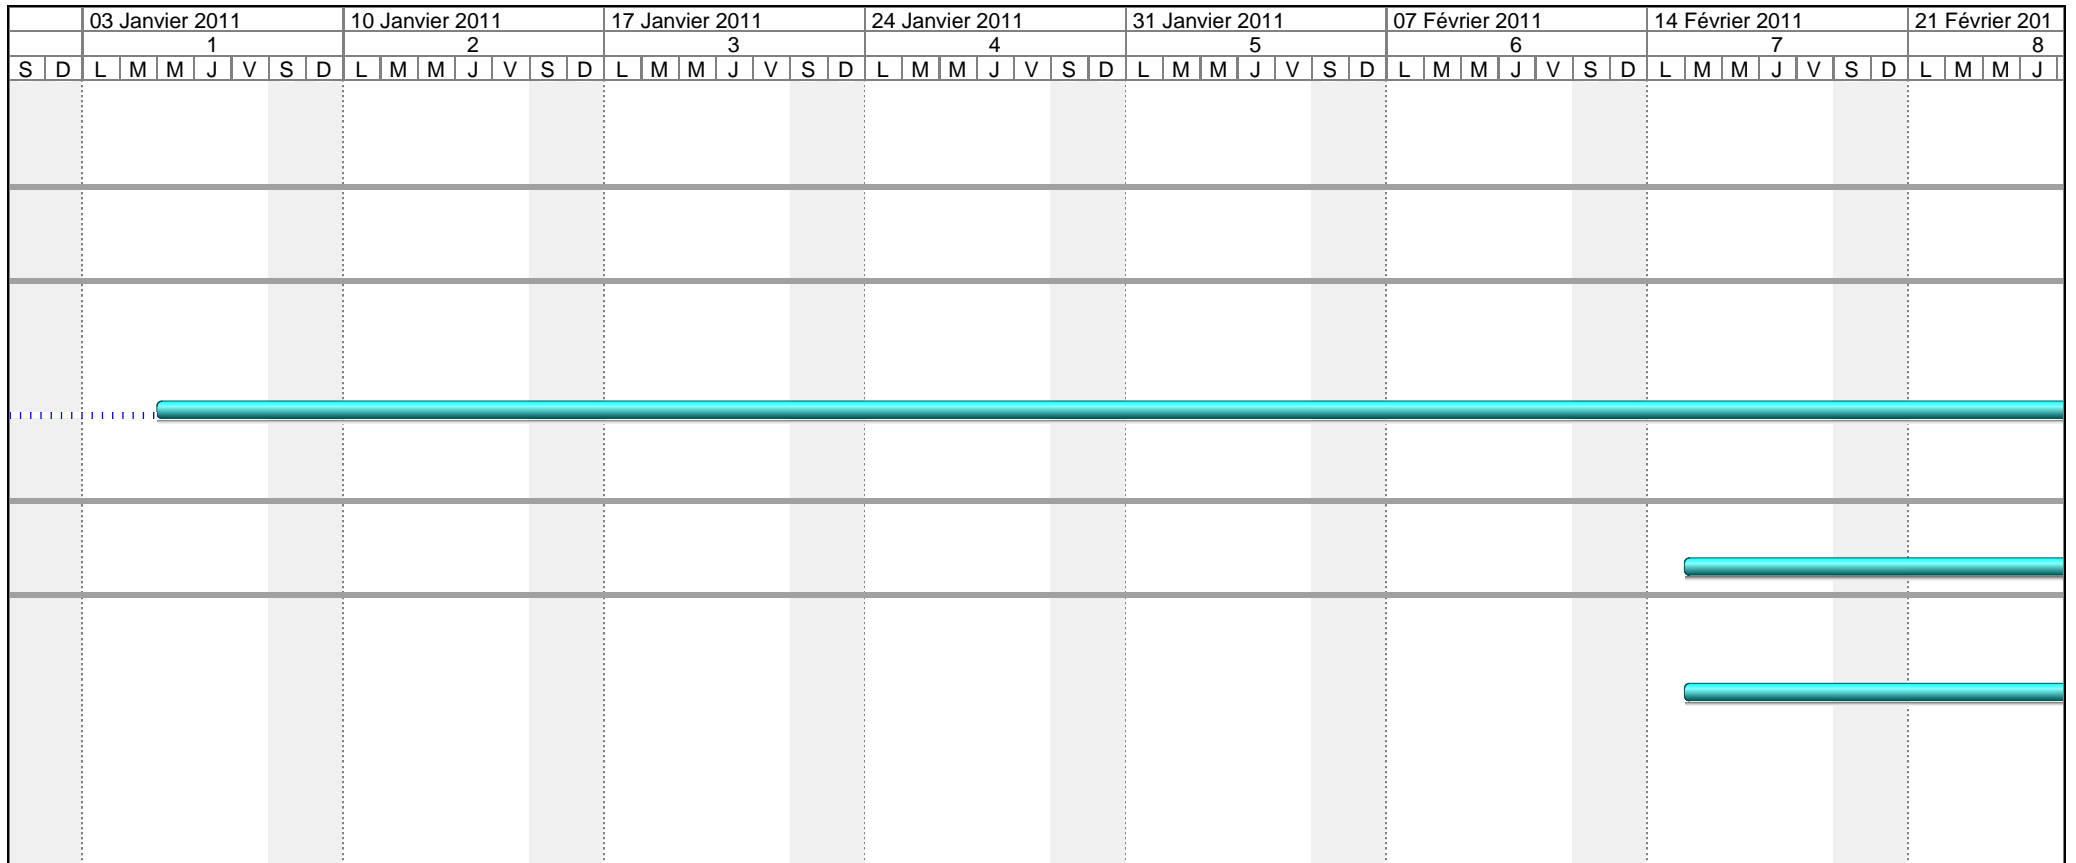




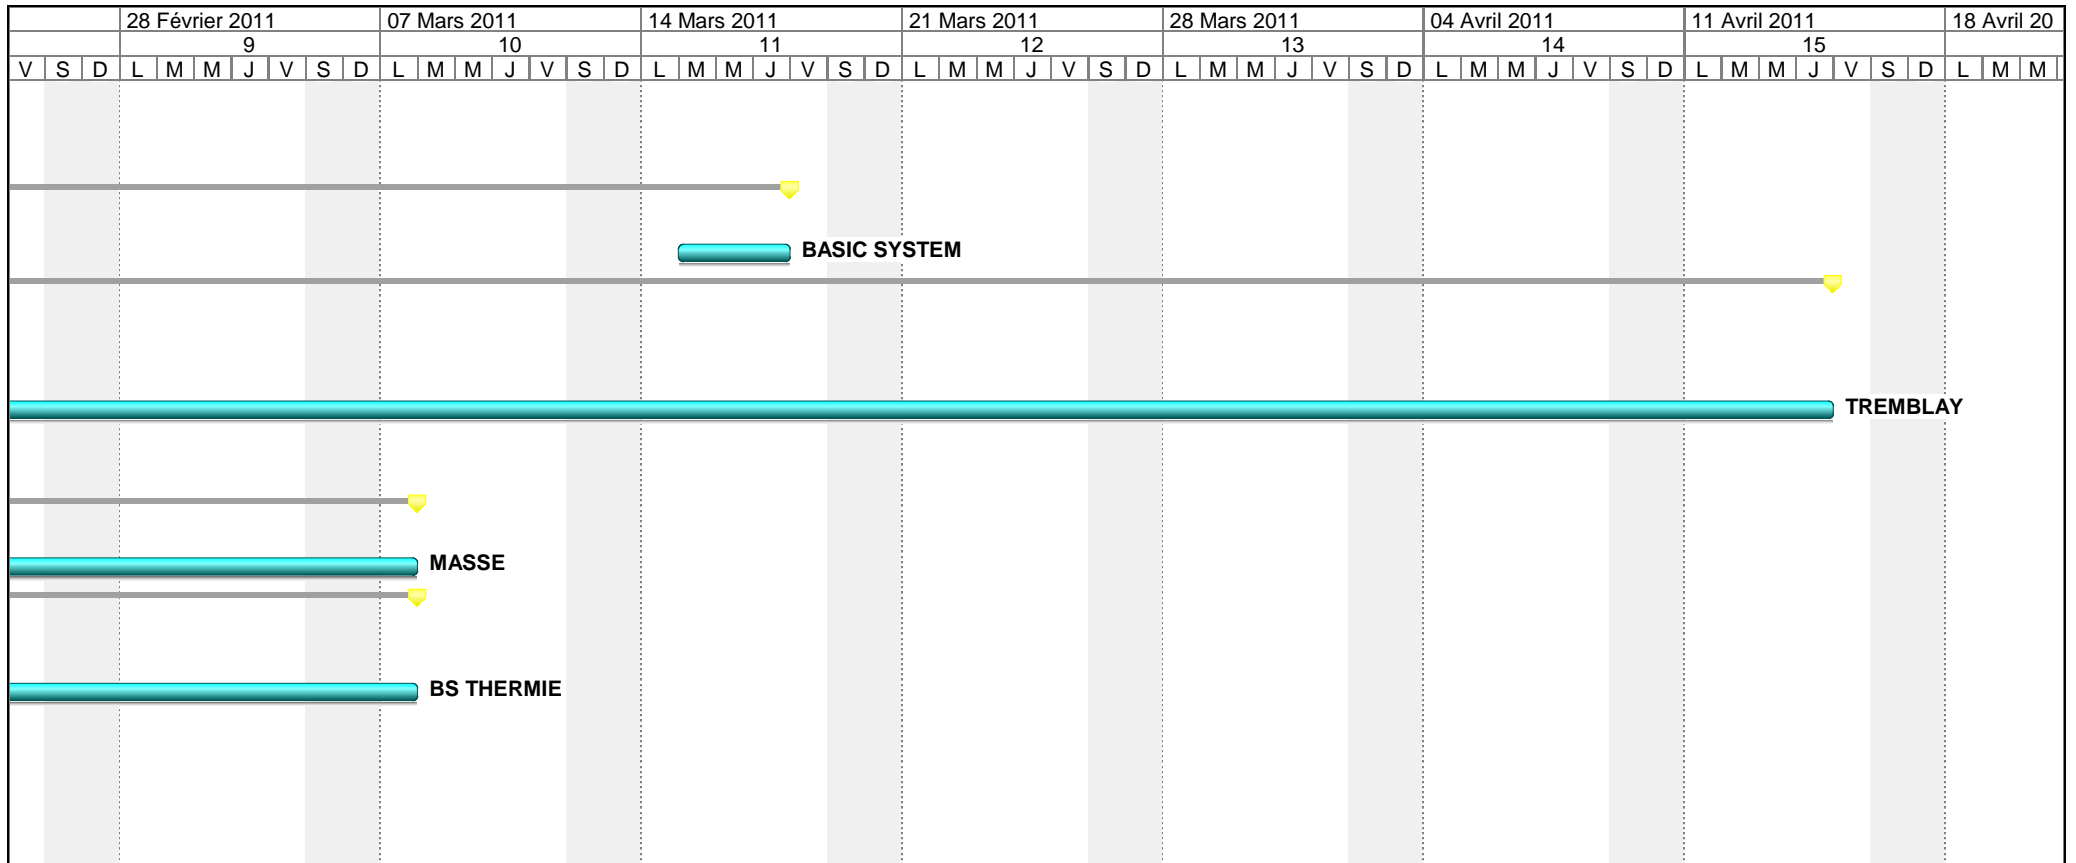
Projet : planning chantier
Date : Mer 29/09/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	



Projet : planning chantier
Date : Mer 29/09/10

- | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|
| Tâche |  | Jalon |  | Tâches externes |  |
| Fractionnement |  | Récapitulative |  | Jalons externes |  |
| Avancement |  | Récapitulatif du projet |  | Échéance |  |



Projet : planning chantier
Date : Mer 29/09/10

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement



Récapitulatif du projet



Échéance

